

Template – Relatório Parcial Sprint 2

1. Identificação da Equipe

MedSystem

Willian Verenka – RA: 22.124.081-5

Théo Zimmerman – RA: 22.123.035-2

Gabriel Lovato – RA: 22.123.004-8

João Guilherme Rogante – RA:22.223.081-5

João Vitor Sitta – RA: 22.123.054-3

2. Status Geral da Sprint

() Em dia

(x) Com atraso leve

() Em Risco

() Atrasado

3. Progresso das Histórias de Usuário

HU	Descrição	Status	Observação
SCRUM-08	Visualizar agenda do médico	Em Revisão	A interface está pronta (SCRUM-51), mas aguarda a finalização da query de dados reais (SCRUM-47) para sair do mock.

SCRUM-45	Autenticar usuários	Fazendo	Em desenvolvimento junto com a SCRUM-49; depende da definição final das regras de validação de CPF e LGPD.
SCRUM-11	Imprimir agenda do médico	Fazendo	O desenvolvimento do endpoint para geração do PDF (SCRUM-46) está em andamento pela equipe de back-end.
SCRUM-44	Notificar paciente ao confirmar consulta	A Fazer	Aguardando o início da lógica de disparo de notificações; depende da estabilização das funcionalidades de agendamento.

4. Indicadores Parciais

Indicador	Valor Atual	Observação
WIP	14	O WIP está bastante elevado em comparação às outras colunas, o que sugere um possível gargalo ou sobrecarga da equipe no momento.
Throughput	0	No momento da captura, nenhuma tarefa foi movida para a coluna final. Isso é comum no início de uma Sprint ou ciclo de medição.
Burndown	29	Como o Throughput é zero, o gráfico de Burndown ainda estaria em sua linha máxima (flat), sem tendência de queda até que os itens de "Em Revisão" comecem a ser finalizados.

5. Impedimentos Encontrados

Impedimento	Impacto	Ação Tomada
Inconsistência de especialidades entre back e front (SCRUM-52)	Afeta a exibição correta dos dados da agenda e a experiência do médico ao visualizar as consultas.	Bug registrado no board e encaminhado para correção; está em revisão pelo time responsável pela integração.
Dúvidas sobre regras de privacidade e LGPD na validação de CPF e aceite de Termos (SCRUM-20)	Atrasou a definição final da tela e da lógica de validação, impactando o andamento da autenticação de usuários.	Alinhamento com o time para revisar os requisitos de LGPD e padronizar a abordagem antes da implementação final.
Dependência entre tarefas de autenticação e as demais telas do sistema	Algumas telas ficaram aguardando a finalização do sistema de autenticação/autorização (SCRUM-49) para evoluir.	Time reorganizou a ordem de execução e priorizou a finalização das tarefas de autenticação para desbloquear o restante.
Tela da Agenda do médico (SCRUM-51) está utilizando dados mockados (chumbados) devido à dependência na integração com o Back-end.	Impede a validação final da funcionalidade com dados reais e atrasa os testes de integração. A tela exibe o layout correto, mas não reflete o estado atual do banco de dados/API.	Desenvolvimento da interface utilizando objetos mock para não bloquear o progresso do Front-end. Foi alinhado com o time de Back-end a priorização da entrega da query de agenda (SCRUM-47) para substituir os dados chumbados na próxima Daily.

6. Próximos Passos até a Review

Priorizar o escoamento da coluna "Em Revisão": Finalizar o code review das regras de privacidade e da tela da agenda para garantir as primeiras entregas no "Concluído".

Concluir testes de integração (SCRUM-30): Validar os filtros para permitir que as tarefas de backend avancem.


Finalizar a integração da Autenticação (SCRUM-49): Liberar o acesso seguro para que as telas de Login e Agenda possam ser testadas com usuários reais.

Saneamento de Bugs: Corrigir a inconsistência de especialidades (SCRUM-52) para não comprometer a demonstração na Review.

Preparação da Demo: Montar o roteiro de apresentação focando no fluxo: Login -> Visualização de Agenda -> Filtros de Privacidade.

8. Evidências

Print do Kanban

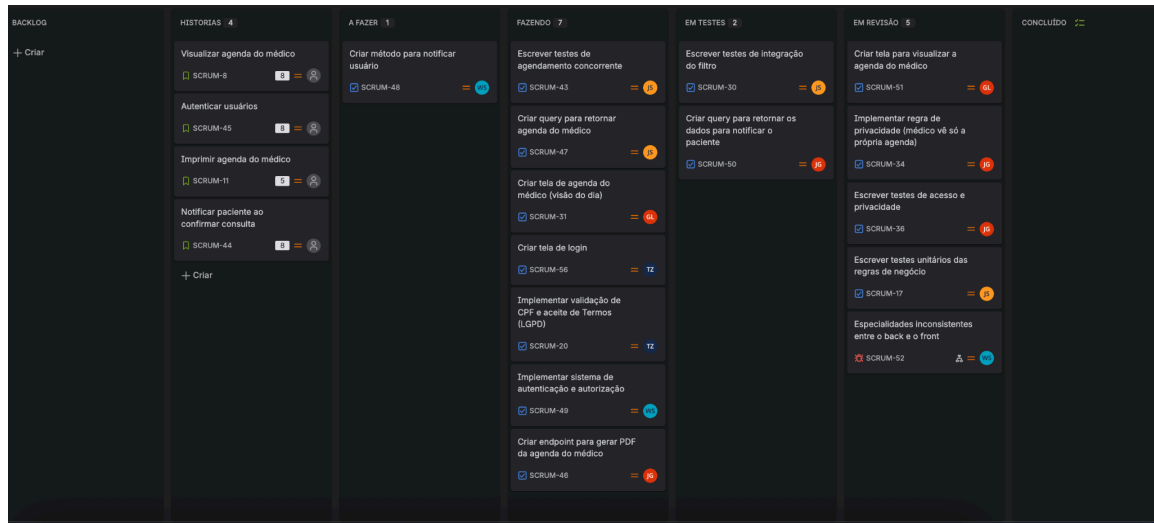

Print dos Riscos

